


# 屋根雨漏り修理予定

平成14年 7月19日  
桜田板金工業所

～ は明り取りの端部納めのビス留めがゆるみ  
雨水が進入しています  
昨年にルーファン廻りの雨漏りと同じ原因です。

屋根板と鉄板の間に専用プライマーを塗り  
変性シリコンコーキングを塗り新しくビス止め  
し、更にコーキングを上塗って劣化防止用の  
アルミテープを貼り修理予定  
前回と同じ方法で修理します。

下の写真は昨年修理した時の写真です。

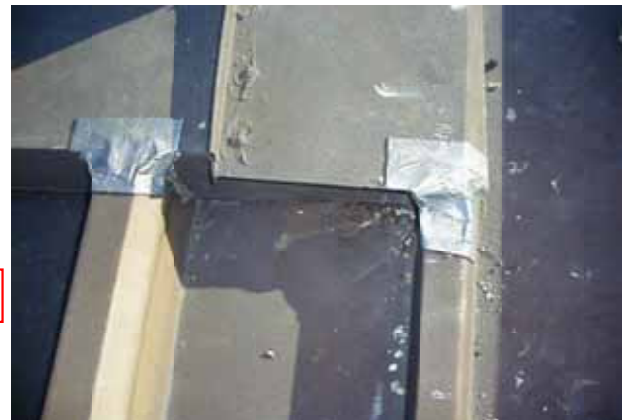

は先日の大雨時に確認しましたが、漏っていませんでした。  
この部分は構造が複雑で修理に費用が多く掛かります。

